


送電線工事の進捗状況

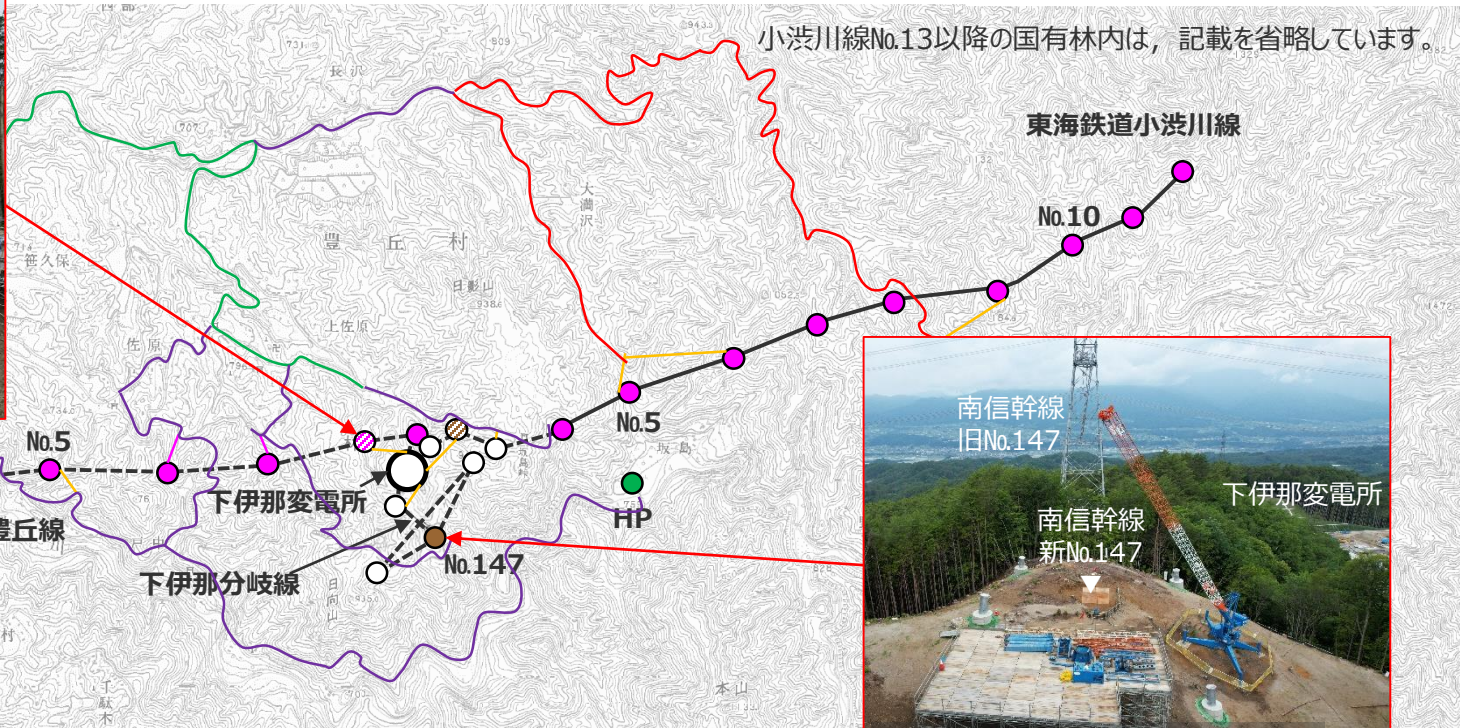

- 凡例
- 🟩 : 仮設工事中
 - 🟦 : 仮設工事完了
 - 🟨 : 基礎工事中
 - 🟪 : 基礎工事完了
 - 🟪 (with pink border) : 組立工事中
 - 🟪 (with pink border) : 組立工事完了
 - (red) : 架線工事中
 - (black) : 架線工事完了
 - 🟡 (with black border) : 撤去
 - (with black border) : 仮工事

	完了基数				
	伐採	仮設	基礎	組立	架線
下伊那南信幹	1/2 基	1/2 基	1/2 基	0/2 基	0/4 径間
豊丘線	9/9 基	10/10 基	8/10 基	7/10 基	0/11 径間
小渋川線	19/20 基	18/20 基	17/20 基	17/20 基	8/21 径間
