



# 第23回豊丘村リニア対策委員会説明資料

## リニア関連電力供給設備

2021年5月24日

中部電力パワーグリッド(株)  
リニア関連送変電工事所

資料の複製・転写はご遠慮願います。

### 下伊那変電所 土地造成工事の状況 (1)



写真①-1 沈砂調整池堰堤 構築完了 (正面より)



写真①-2 沈砂調整池堰堤 構築完了 (上部より)





# 下伊那変電所 土地造成工事の状況（2）

写真② 土留擁壁上部 盛土状況



写真④ 変電所ヤード 盛土状況



写真③ 搬入道路 盛土状況



写真⑤ 変電所ヤード 切土・盛土状況



3 資料の複製・転写はご遠慮願います。

## 変電所工事の進捗スケジュール

項目	2018年度		2019年度		2020年度		2021年度		備考	
	10～3	4～9	10～3	4～9	10～3	4～9	10～3			
村道・県道改修	[Bar]		[Bar]		[Bar]					
土地造成工事	仮設設備	▼3/4着手 [Bar]								・仮設道路造成 ・仮設排水路設置 ・仮設沈砂池構築
	伐採	伐採・除根共 [Bar]				伐採 除根(切土・盛土に併せて実施) [Bar]				1回目：道路・沈砂調整池周辺 2回目：その他
	土留擁壁			▼12月土留擁壁(2基) 本体構築完了 [Bar]						土留擁壁 2基
	沈砂調整池			12月 堰堤本体構築完了▼ [Bar]				水叩き・最終樹		
	搬入道路			[Bar]		[Bar]		[Bar]		
	切土・盛土					[Bar]		[Bar]		
機器・基礎・建物工事							[Bar]		2024年10月 運転開始予定まで	

4 資料の複製・転写はご遠慮願います。



# 送電線工事の進捗状況



- 凡例
- : 仮設工事中
  - : 仮設工事完了
  - : 基礎工事中
  - : 基礎工事完了
  - : 組立工事中
  - : 組立工事完了
  - : 架線工事中
  - : 架線工事完了
  - : 撤去
  - : 仮工事

	完了基数				
	伐採	仮設	基礎	組立	架線
下伊那南信幹	0/2 基	0/2 基	0/2 基	0/2 基	0/4 径間
豊丘線	7/9 基	1/10 基	0/10 基	0/10 基	0/11 径間
小渋川線	17/20 基	9/20 基	8/20 基	3/20 基	0/21 径間

5 資料の複製・転写はご遠慮願います。

# 送電線工事の進捗状況

写真① 村道小枝線 災害復旧 (完了)



村道小枝線

写真② 小渋川線No.4 組立工事 (工事中)



村道佐原野田の平線

写真③ 小渋川線No.10 基礎工事 (完了)



写真④ 豊丘線No.9 仮設工事 (搬入路完了)




村道小園柏原線

6 資料の複製・転写はご遠慮願います。



# 送電線工事の車両通行ルート

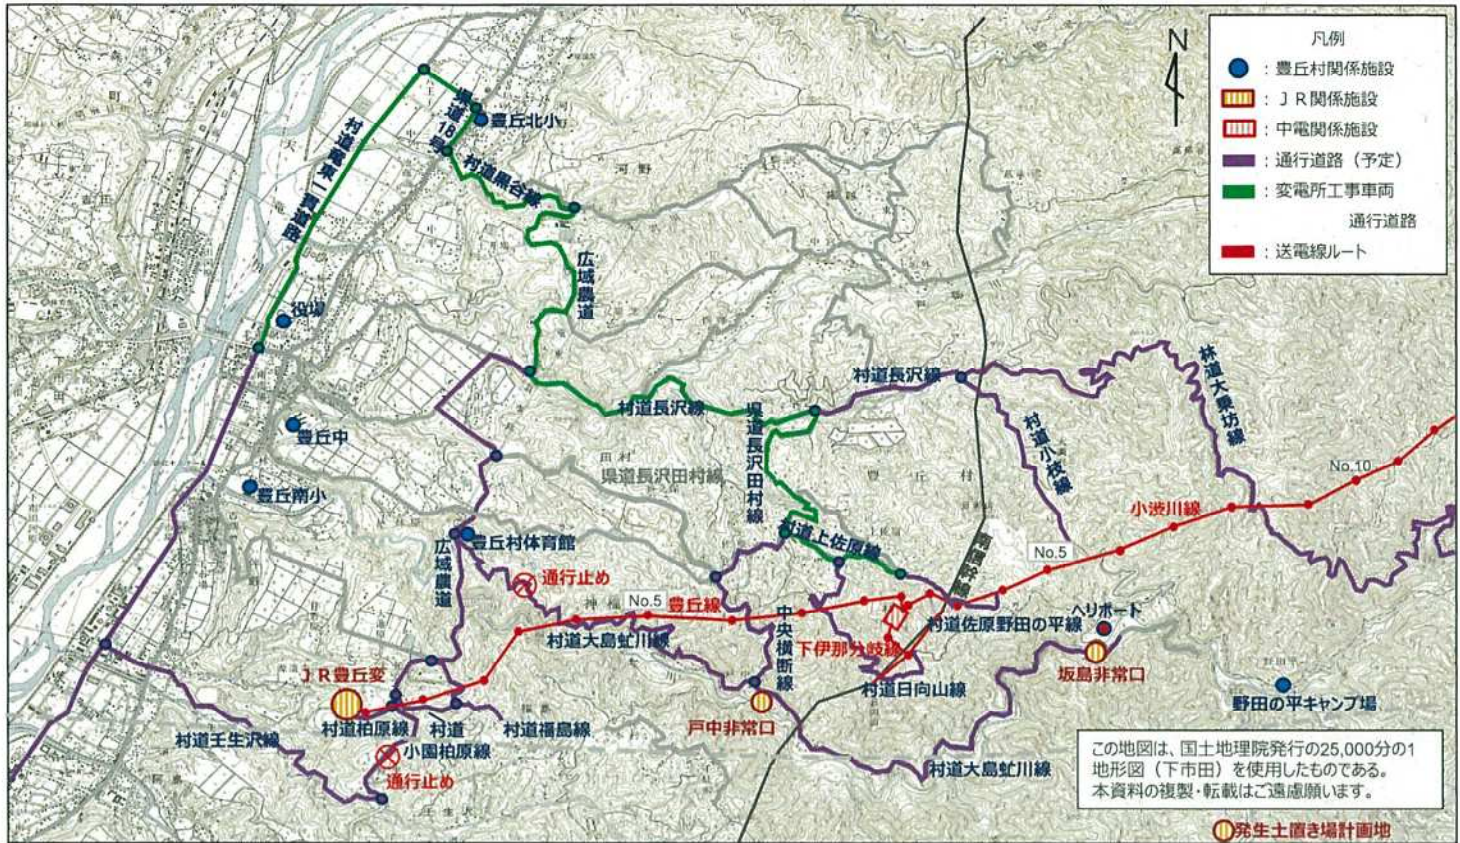

7 資料の複製・転写はご遠慮願います。

# 送電線工事のスケジュール

地区名	2019年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		2024年度	
	4~9	10~3	4~9	10~3	4~9	10~3	4~9	10~3	4~9	10~3	4~9	10~3
林区	野田平	小渋川線 (5~20)										
	上佐原	小渋川線 (1~4)										
			豊丘線 (1~3)									
	下佐原	豊丘線 (4~5)										
木門			豊丘線 (6)									
福島区	本村											
	寺島1											
	大柏											

<凡例>

- : 小渋川線の工事
- : 豊丘線の工事
- : 南信幹線の工事
- : 架線工事
- : 休工 (止め山等)

8 資料の複製・転写はご遠慮願います。



## ■中部電力パワーグリッド株式会社

### リニア関連送変電工事所

〒395-0085 飯田市吾妻町100番地

TEL 0265-54-6902 fax 050-7771-9001

土日・祝日を除く、午前9時～午後4時30分まで

⑨ 資料の複製・転写はご遠慮願います。



中部電力パワーグリッド

資料の複製・転写はご遠慮願います。
