


送電線工事の進捗状況

豊丘線No.1~6架線工事 (完了)

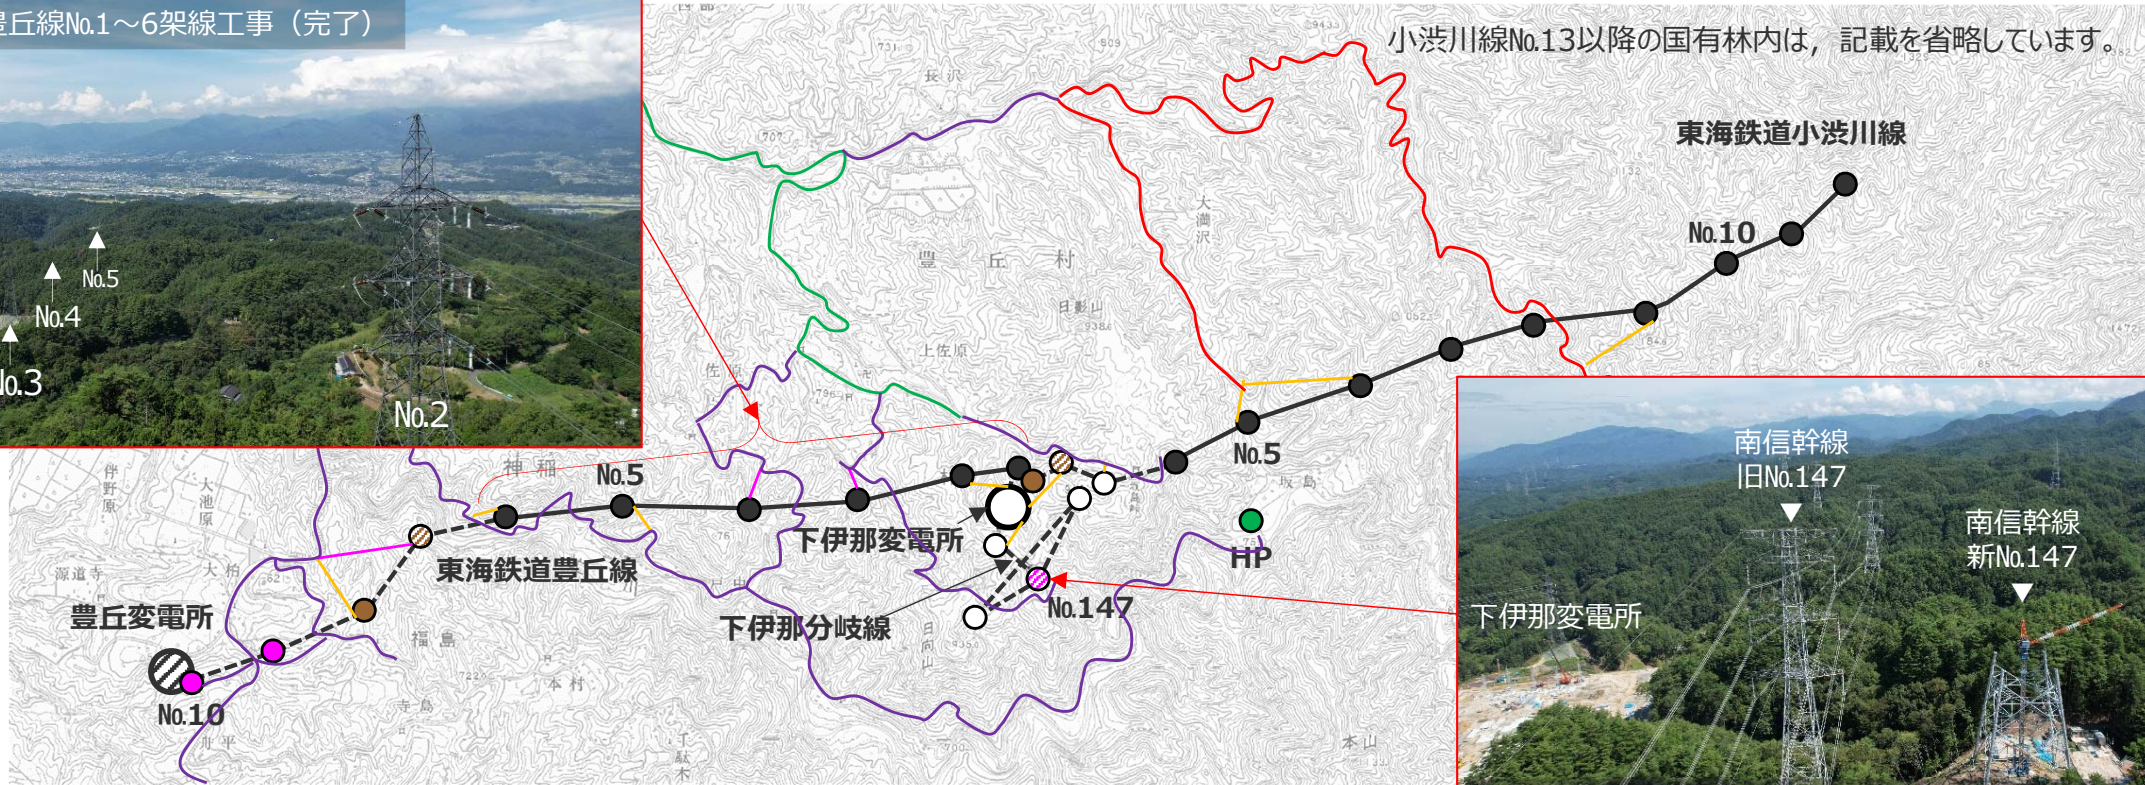

- 凡例
- (green) : 仮設工事中
 - (brown) : 基礎工事中
 - (pink) : 組立工事中
 - (red) : 架線工事中
 - (yellow) : 撤去
 - (green) : 仮設工事完了
 - (brown) : 基礎工事完了
 - (pink) : 組立工事完了
 - (black) : 架線工事完了
 - (black) : 完了

	完了基数				
	伐採	仮設	基礎	組立	架線
下伊那南信幹	1/2 基	1/2 基	1/2 基	0/2 基	0/4 径間
豊丘線	9/9 基	10/10 基	9/10 基	8/10 基	5/11 径間
小渋川線	19/20 基	19/20 基	18/20 基	17/20 基	17/21 径間
