

# 伊那山地トンネル新設 (戸中・壬生沢工区) 工事だより

2021年6月号 (Vol. 12)

回覧

飛島・市川工務店工事共同企業体  
(戸中・壬生沢工区)


拝啓 雨に濡れた青葉がいつそう鮮やかな季節となりました。

工事の進捗ですが、御手形交差点では西側の取付道路もほぼ終わりました。村道黒谷線では、拡幅工事も擁壁設置工事は終わり、終盤に入りました。戸中発生土置き場では、引き続き調整池護岸工(大型ブロック積)・地下排水工・埋設工(擁壁)、ベルトコンベア工事などの工事を施工中です。戸中非常口ではヤード内の舗装工事も終わり、発生土置き場につながるベルトコンベアの施工を行っています。

今後も、村内の広い範囲で、工事車両の運行なども増えご不便をおかけしていますが、工事の施工につきまちは安全・環境に十分な配慮を行いながら進めてまいりますので、引き続きご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

## 6~7月の主な工事予定

- 御手形交差点：交差点拡幅に伴う横断管・舗装工事、水道入替工事などを予定。  
交通規制 有 (片側通行：3/1~6/30) ※水道管入替工事は7月下旬を予定。(交通規制 有)
- 村道黒谷線：道路改良工事(舗装他)を予定。交通規制 有 (片側通行：4/12~6/30)
- 村道佐原線：改良工事のための調査(地質調査ボーリング)を予定。交通規制なし
- 村道中央横断線：非常口ヤード付近にて横断・流末排水を予定。交通規制なし  
※通行の際は、工事のためお待ちいただく可能性があります。
- 発生土置き場(戸中)：造成準備(地下排水、調整池、埋設工・ベルトコンベア工事等)  
斜坑掘削開始後はベルコンによる発生土受入れを予定。
- 戸中非常口：ヤード整備(仮設備、舗装工事他)・斜坑掘削(6月下旬より)を予定。

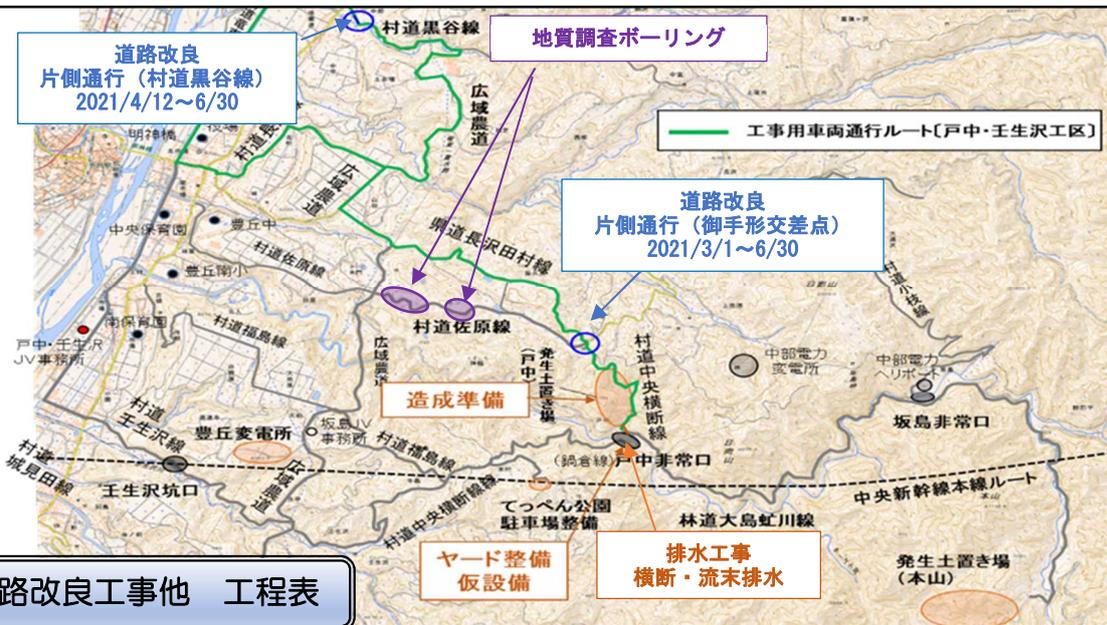

## 道路改良工事他 工程表

工種	6月	7月	8月	9月
御手形・木門交差点 道路改良	御手形交差点改良	御手形交差点改良	木門交差点改良	
村道黒谷線 道路改良			お盆休み	
村道佐原線 調査業務		地質調査ボーリング		
村道中央横断線 排水工工事	横断・流末排水			
林道大島虹川線 道路改良		拡幅		
戸中発生土置き場 造成準備・造成			日曜未定	
戸中非常口 仮設備・トンネル				

### 村道黒谷線 施工状況

村道黒谷線はし型擁壁の設置が終わり、路盤工と舗装工事などを施工していきます。



### 御手形交差点 施工状況

村道佐原線は取付道路も終わりましたが、村道中央横断線の水道管入替えの工事を7月下旬頃施工しその後、舗装などを予定しています。



### 戸中発生土置き場 施工状況

戸中発生土置き場では、ベルトコンベアが繋がりと、並行して調整池護岸工（大型ブロック積）の施工と地下排水工・埋設工などを行っています。



ベルトコンベア

土砂ピット

### 戸中非常口ヤード 施工状況

戸中非常口ヤードでは、坑口から発生土置き場に繋がるベルトコンベアの設置がほぼ完了しました。



ベルトコンベア

坑口

ベルトコンベア

ちょっと寄り道

お気に入りのてっぺん公園からの景色です。ここに来るととっても気持ちいいです♪

リュウコ・リュウタです。だんだんと蒸し暑くなってきましたね。こまめに水分補給して熱中症に気をつけましょう。



だんQくん



リュウコ リュウタ  
飛島・市川工務店工事共同企業体  
イメージキャラクター

お問い合わせ先

施工業者 飛島・市川工務店工事共同企業体

現場事務所 豊丘村大字神稲 9105-1

TEL 0265-49-0502
