


送電線工事の進捗状況

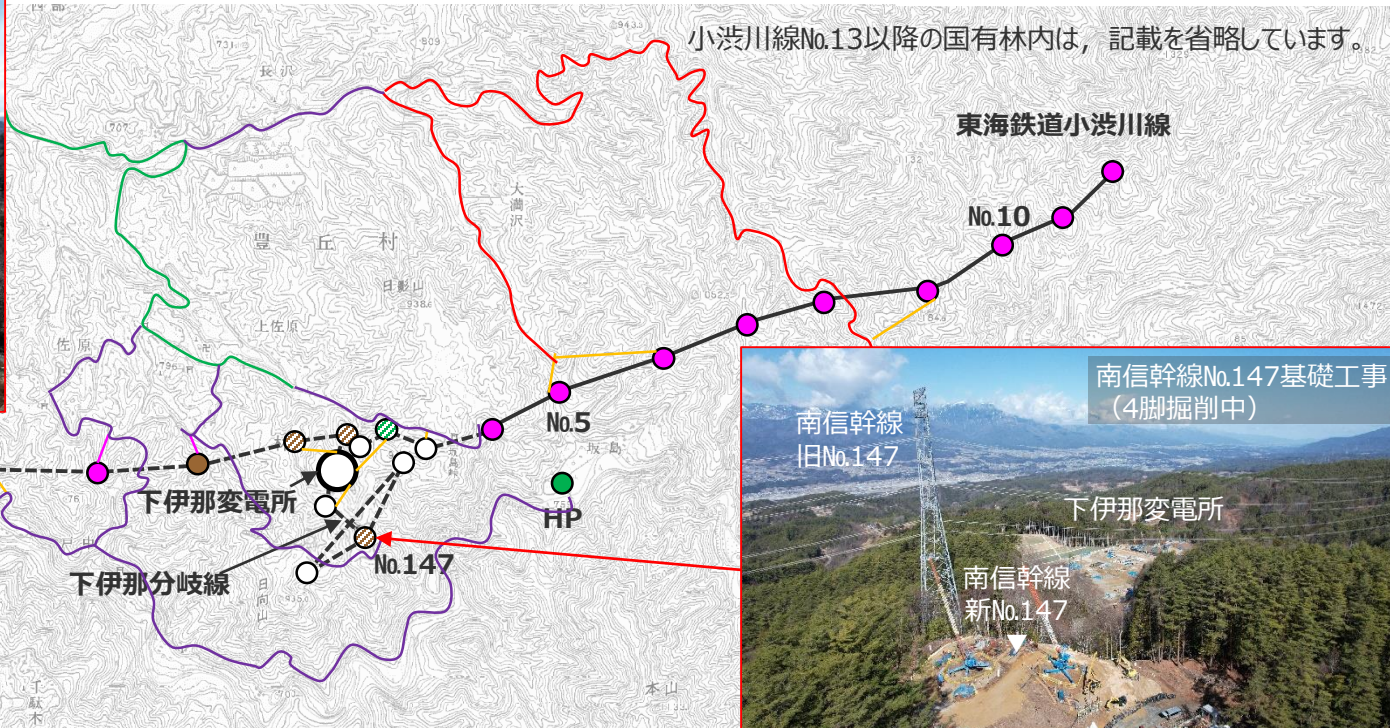

- 凡例
- (green with diagonal lines) : 仮設工事中
 - (green) : 仮設工事完了
 - (orange with diagonal lines) : 基礎工事中
 - (orange) : 基礎工事完了
 - (pink with diagonal lines) : 組立工事中
 - (pink) : 組立工事完了
 - (red) : 架線工事中
 - (black) : 架線工事完了
 - (yellow) : 撤去
 - (white with black border) : 仮工事

	完了基数				
	伐採	仮設	基礎	組立	架線
下伊那南信幹	1/2 基	1/2 基	0/2 基	0/2 基	0/4 径間
豊丘線	9/9 基	8/10 基	6/10 基	4/10 基	0/11 径間
小渋川線	19/20 基	17/20 基	16/20 基	14/20 基	8/21 径間
