

伊那山地トンネル新設 (戸中・壬生沢工区) 工事だより

2021年8月号 (Vol. 14)

回覧

飛島・市川工務店工事共同企業体
(戸中・壬生沢工区)

このたびの大雨で被害に遭われた方々へ心よりお見舞い申し上げます。

工事の進捗ですが、御手形交差点では、今月末に舗装工事を行い完了します。木門交差点の工事は準備が整い次第、来月より開始する予定です。発生土置き場(戸中)では、地下排水設備・盛土工などの工事を施工中です。戸中非常口では、戸中斜坑の掘削工事を施工中です。

今後も、村内の広い範囲で、工事車両の運行なども増えご不便をおかけしますが、工事の施工につきましては安全・環境に十分な配慮を行いながら進めてまいりますので、引き続きご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

8~9月の主な工事予定

- 御手形交差点：交差点拡幅に伴う舗装工事を予定
片側交通規制 有 (7/26~8/31)
- 木門交差点：交差点拡幅のための準備工を今月から着手する予定
片側交通規制 有 (9/1~12/30)
- 林道大島虻川線：道路拡幅工事を9月20日から予定
片側交通規制 有 (9/20~10/23)
- 発生土置き場(戸中)：地下排水工、調整池工、造成工事を予定
坑外すり運搬(発生土置き場(戸中)→坂島仮置き場)
- 戸中非常口：斜坑掘削

※交通規制の期間が、短くなるよう努めていきます。



道路改良工事他 工程表

工種		8月	9月	10月	11月
御手形交差点	道路改良	■	■		
木門交差点	道路改良		■	■	■
林道大島虻川線	道路改良		■	■	■
戸中発生土置き場	造成準備・造成	■	■	■	■
戸中非常口	トンネル	■	■		

お盆休み 8/7~8/15

御手形交差点 施工状況

村道中央横断線の水道入替工事が完了しました。
引き続き、舗装などの工事を行います。



戸中斜坑 掘削状況

戸中非常口では斜坑掘削を行っています。




戸中発生土置き場 施工状況

戸中発生土置き場では、調整池工、地下排水工及び坑外すり運搬工などを行っています。

土砂ピット



調整池工

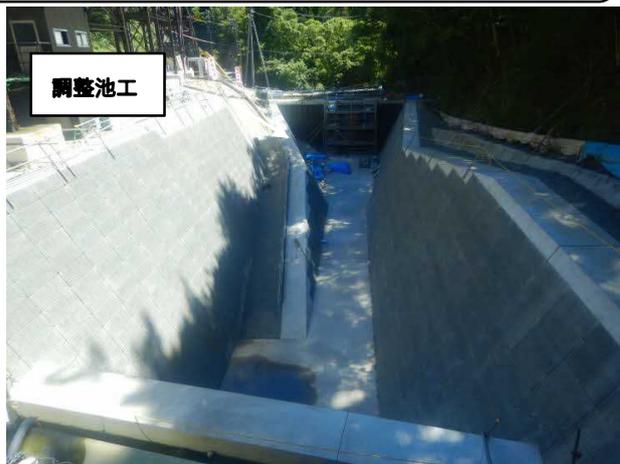

ちょっと寄り道

夏の雲が広がるてっぺん
公園からの写真です!!



リュウコ・リュウタです。
朝晩は過ごしやすい気温になってきましたね。



たんQくん



リュウコ
飛島・市川工務店工事共同企業体
リュウタ
飛島・市川工務店工事共同企業体
イメージキャラクター

お問い合わせ先

施工業者 飛島・市川工務店工事共同企業体
伊那山地トンネル西作業所
現場事務所 豊丘村大字神稲 9105-1
TEL 0265-49-0502
所長 山田 博
