


第23回豊丘村リニア対策委員会

令和3年5月24日(月) 19:00~

於:豊丘村保健センター2F



東海旅客鉄道株式会社

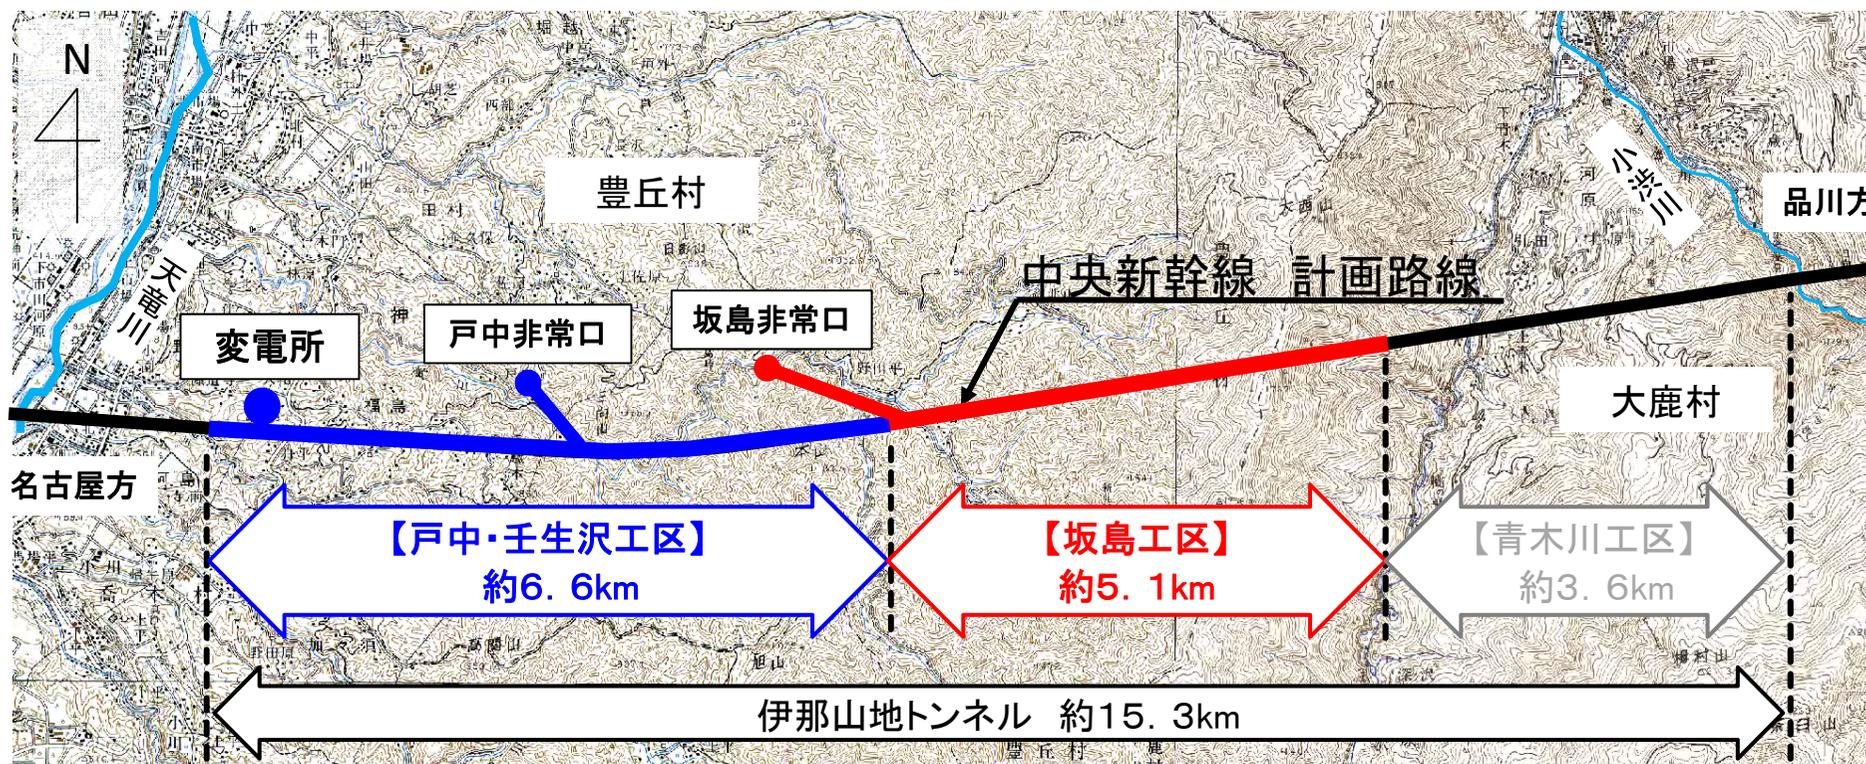

工事名称：『中央新幹線伊那山地トンネル新設
(戸中・壬生沢工区)』


『中央新幹線伊那山地トンネル新設(坂島工区)』

請負会社：飛鳥建設(株)、(株)市川工務店工事共同企業体

清水建設(株)、大日本土木(株)工事共同企業体


契約工期：2018年9月6日 より 2026年9月30日

2016年9月29日 より 2026年9月30日

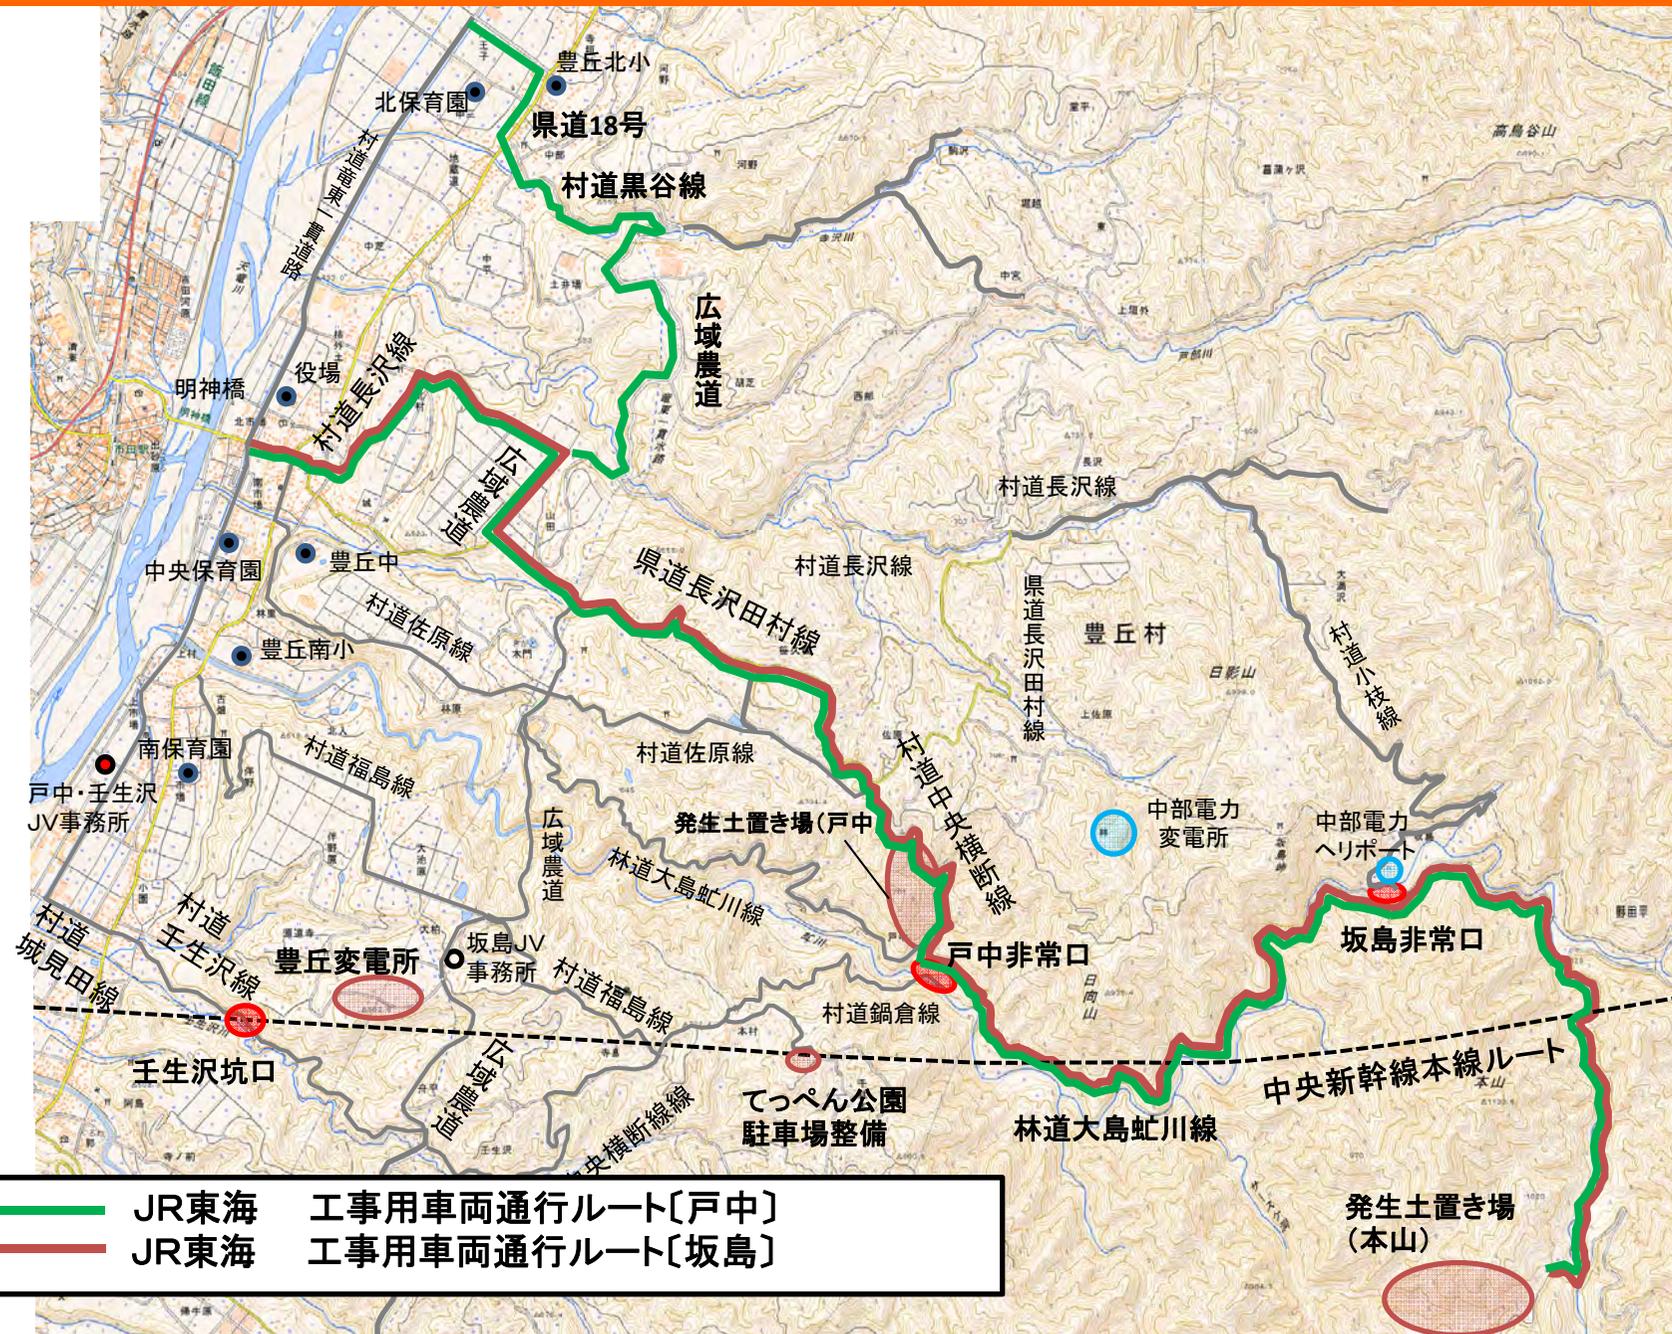


	JR東海	工事用車両通行ルート〔戸中〕
	JR東海	工事用車両通行ルート〔坂島〕

坂島非常口ヤード

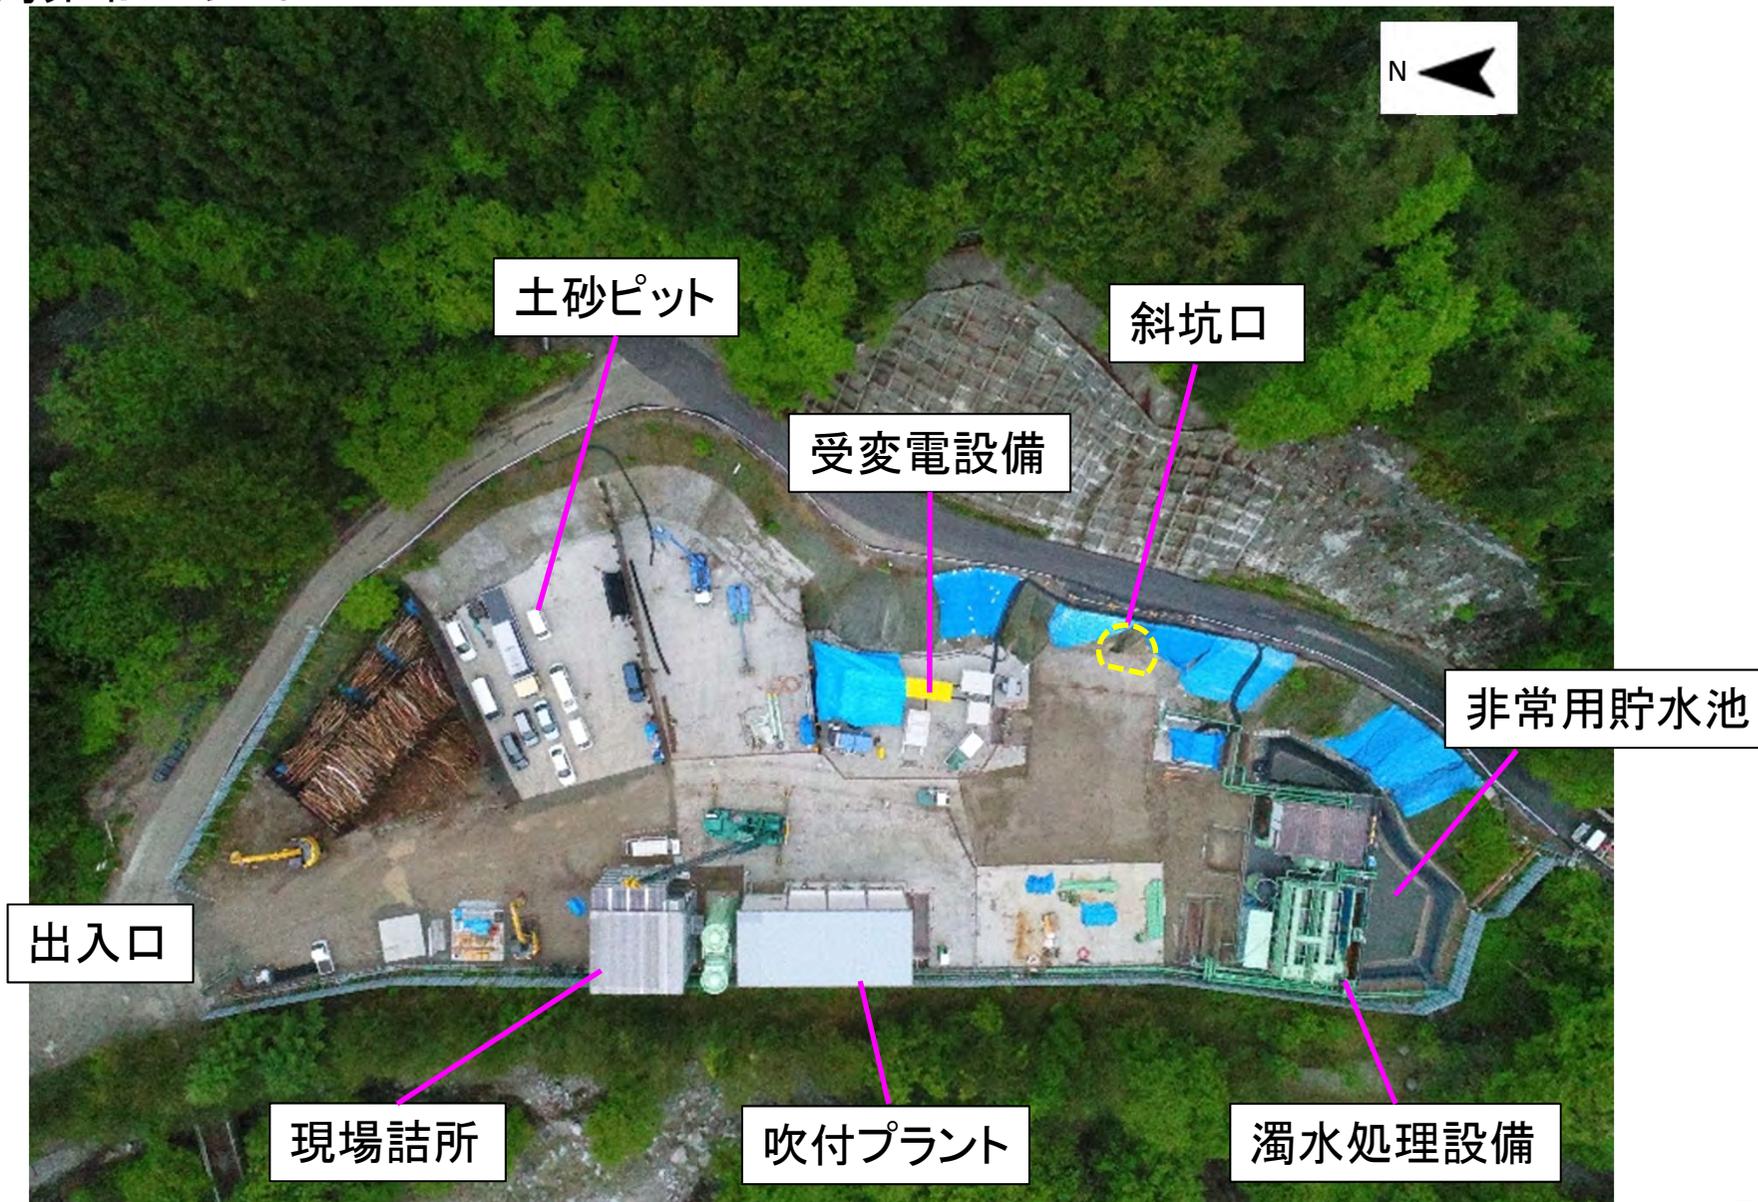

引き続き、掘削開始に向けて設備等の設置作業を進めていきます。

発生土置き場(本山)

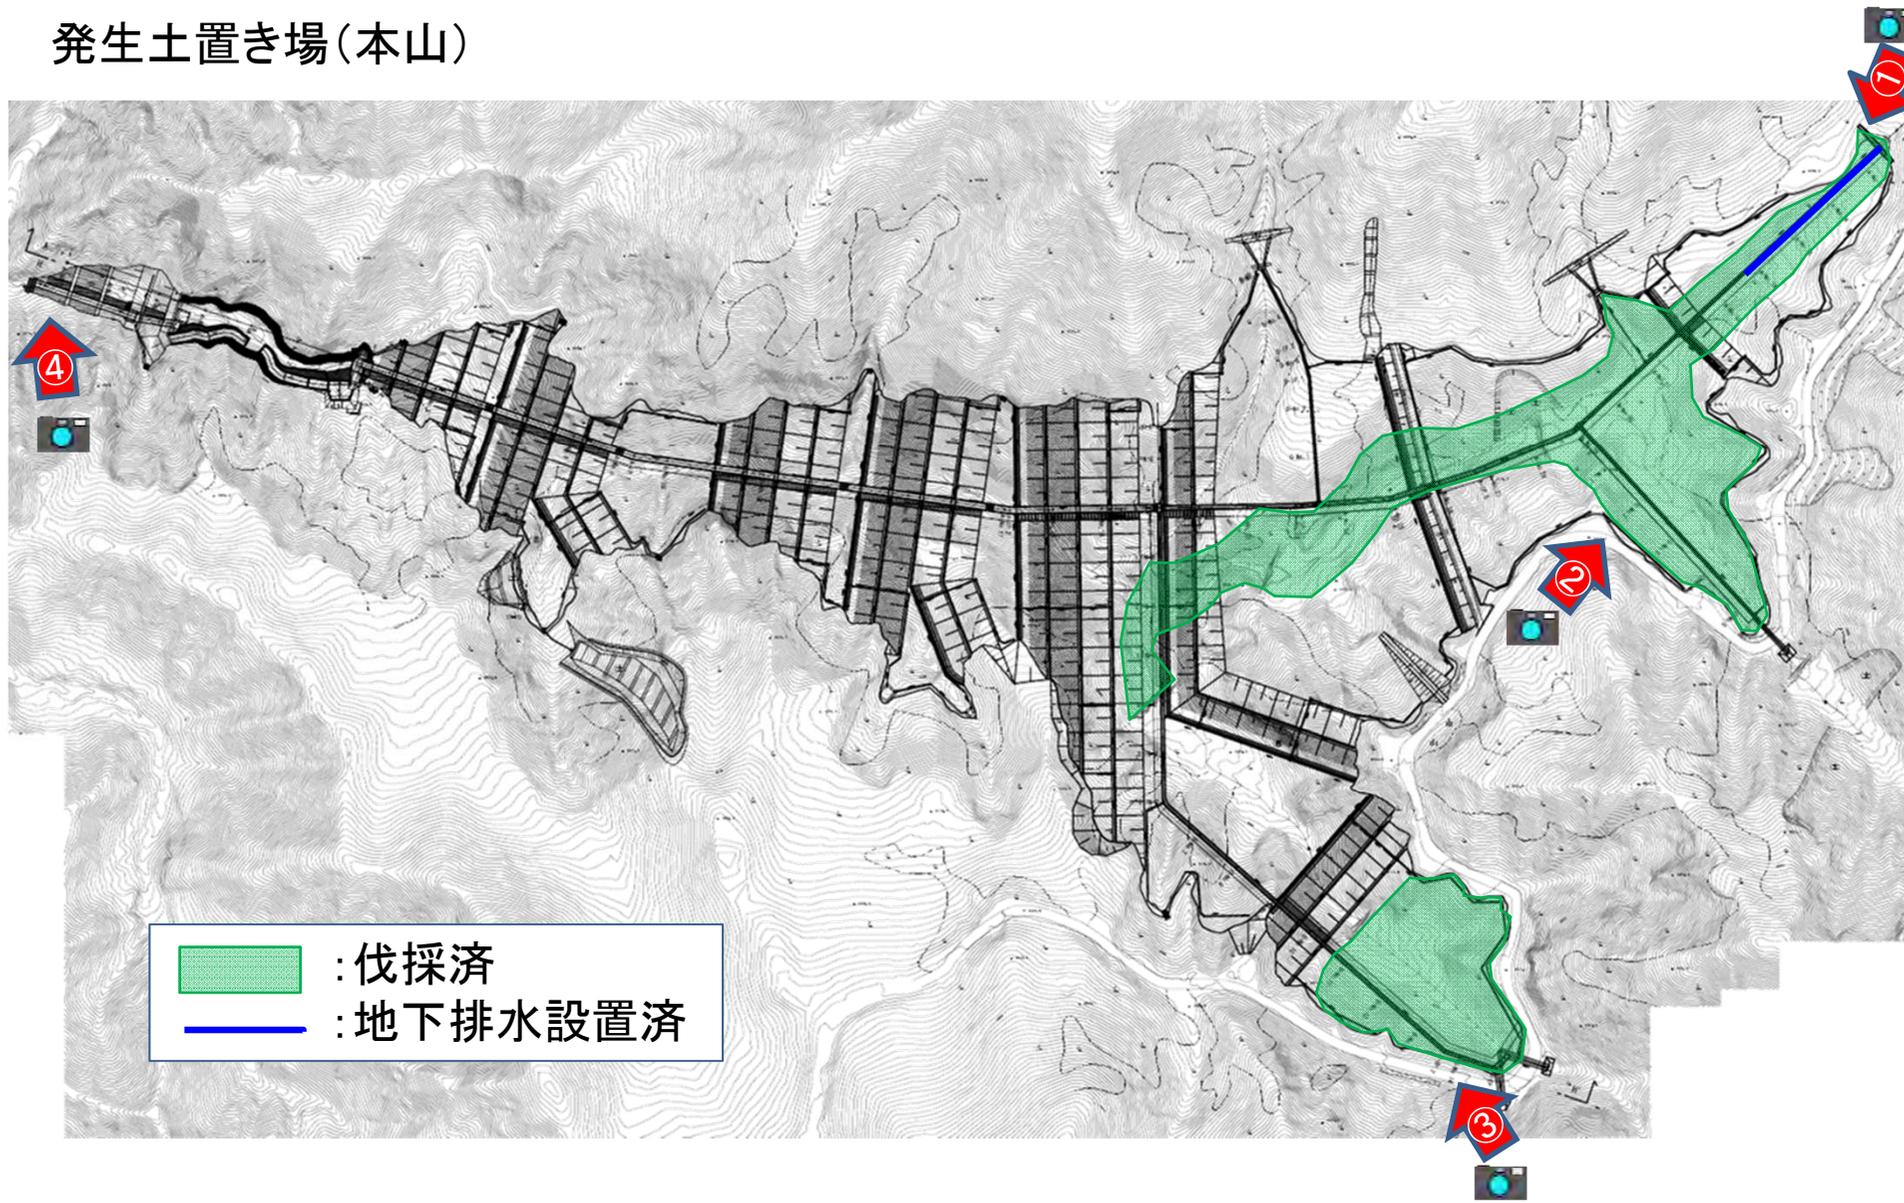

発生土置き場(本山)



発生土置き場(本山)



仮設沈砂池設置状況



表土撤去の確認状況



地下排水管の敷設状況


本日の対策委員会

主な作業箇所	4月	5月	6月
坂島非常口ヤード (坑外設備設置・掘削)			
発生土置き場(本山) (伐採、パイロット道路造成、 地下排水工)			
発生土仮置き場(坂島) (基排水工、舗装、造成)			

※工程は現時点の予定です。


準備が完了次第、7月中旬以降の斜坑掘削を予定しております。

戸中非常口ヤード

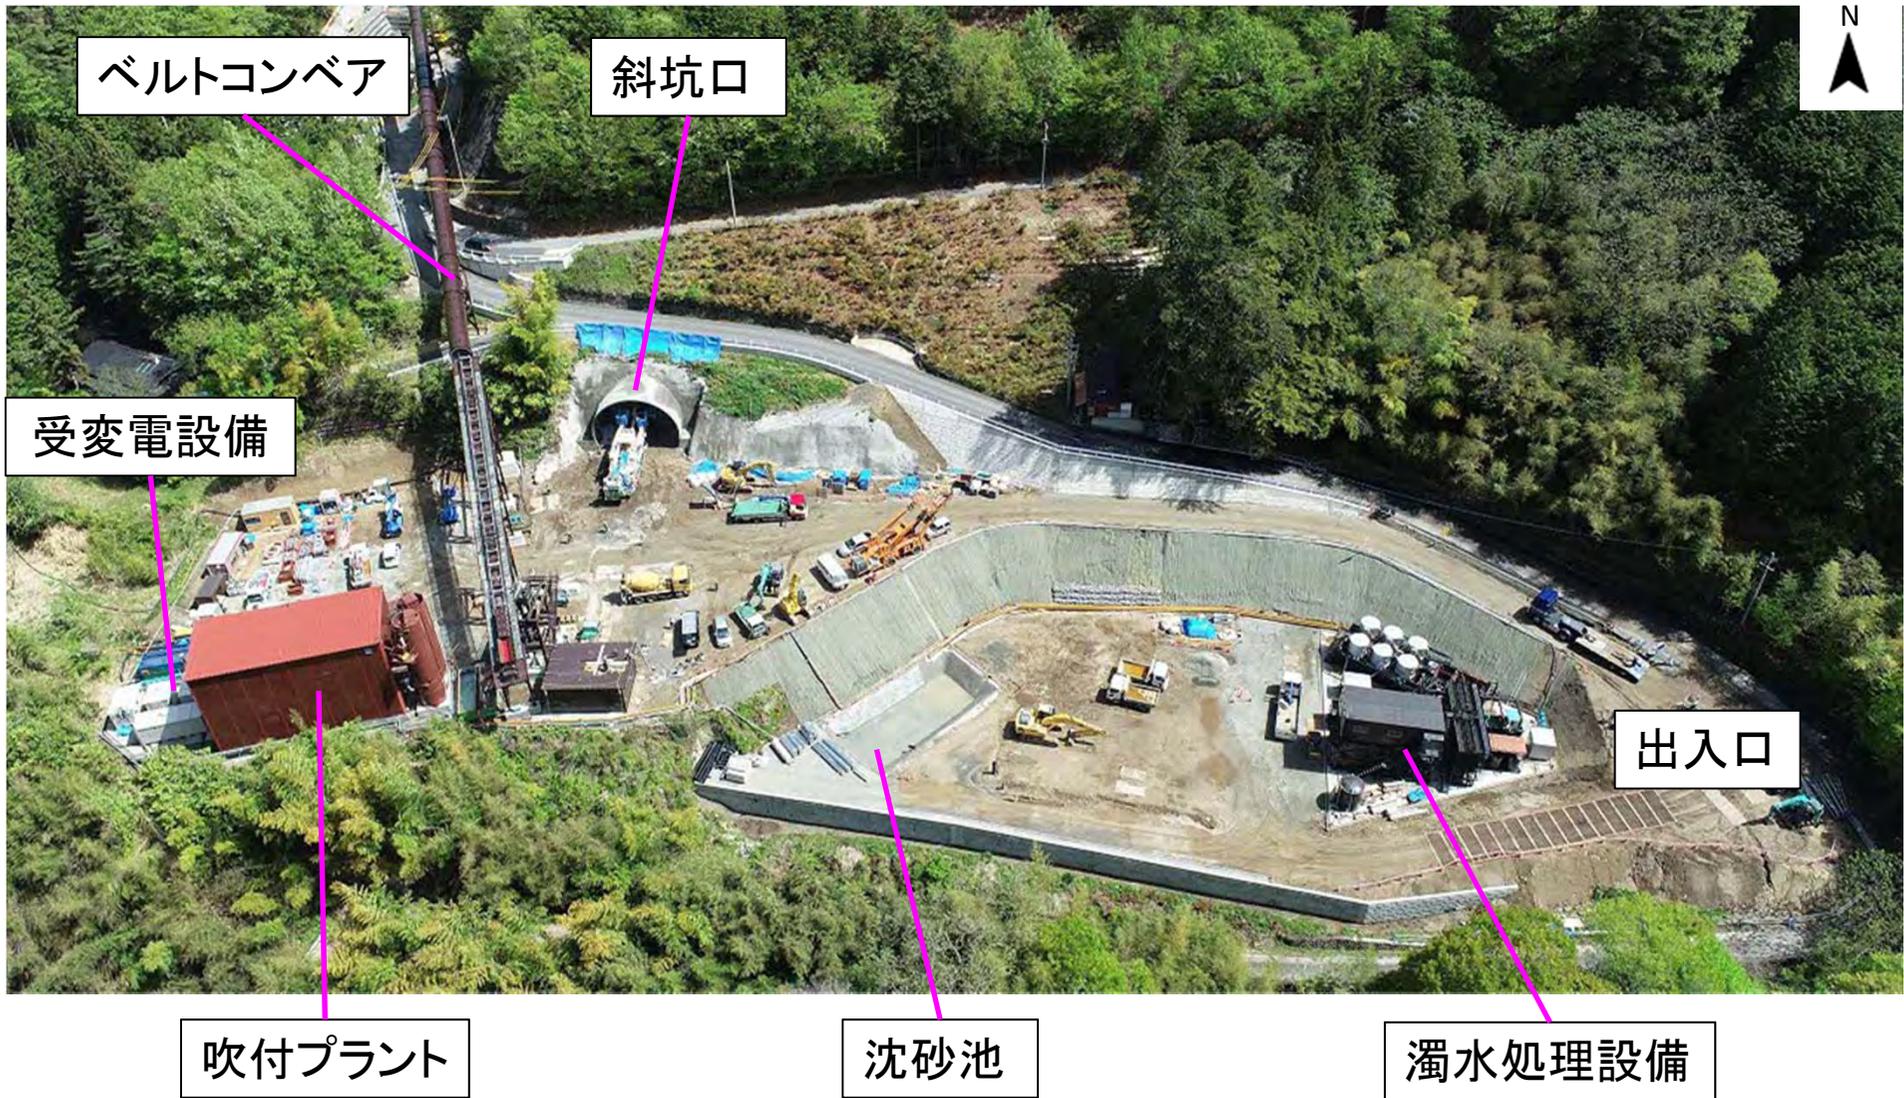

引き続き、掘削開始に向けて設備等の設置作業を進めていきます。

発生土置き場(戸中)

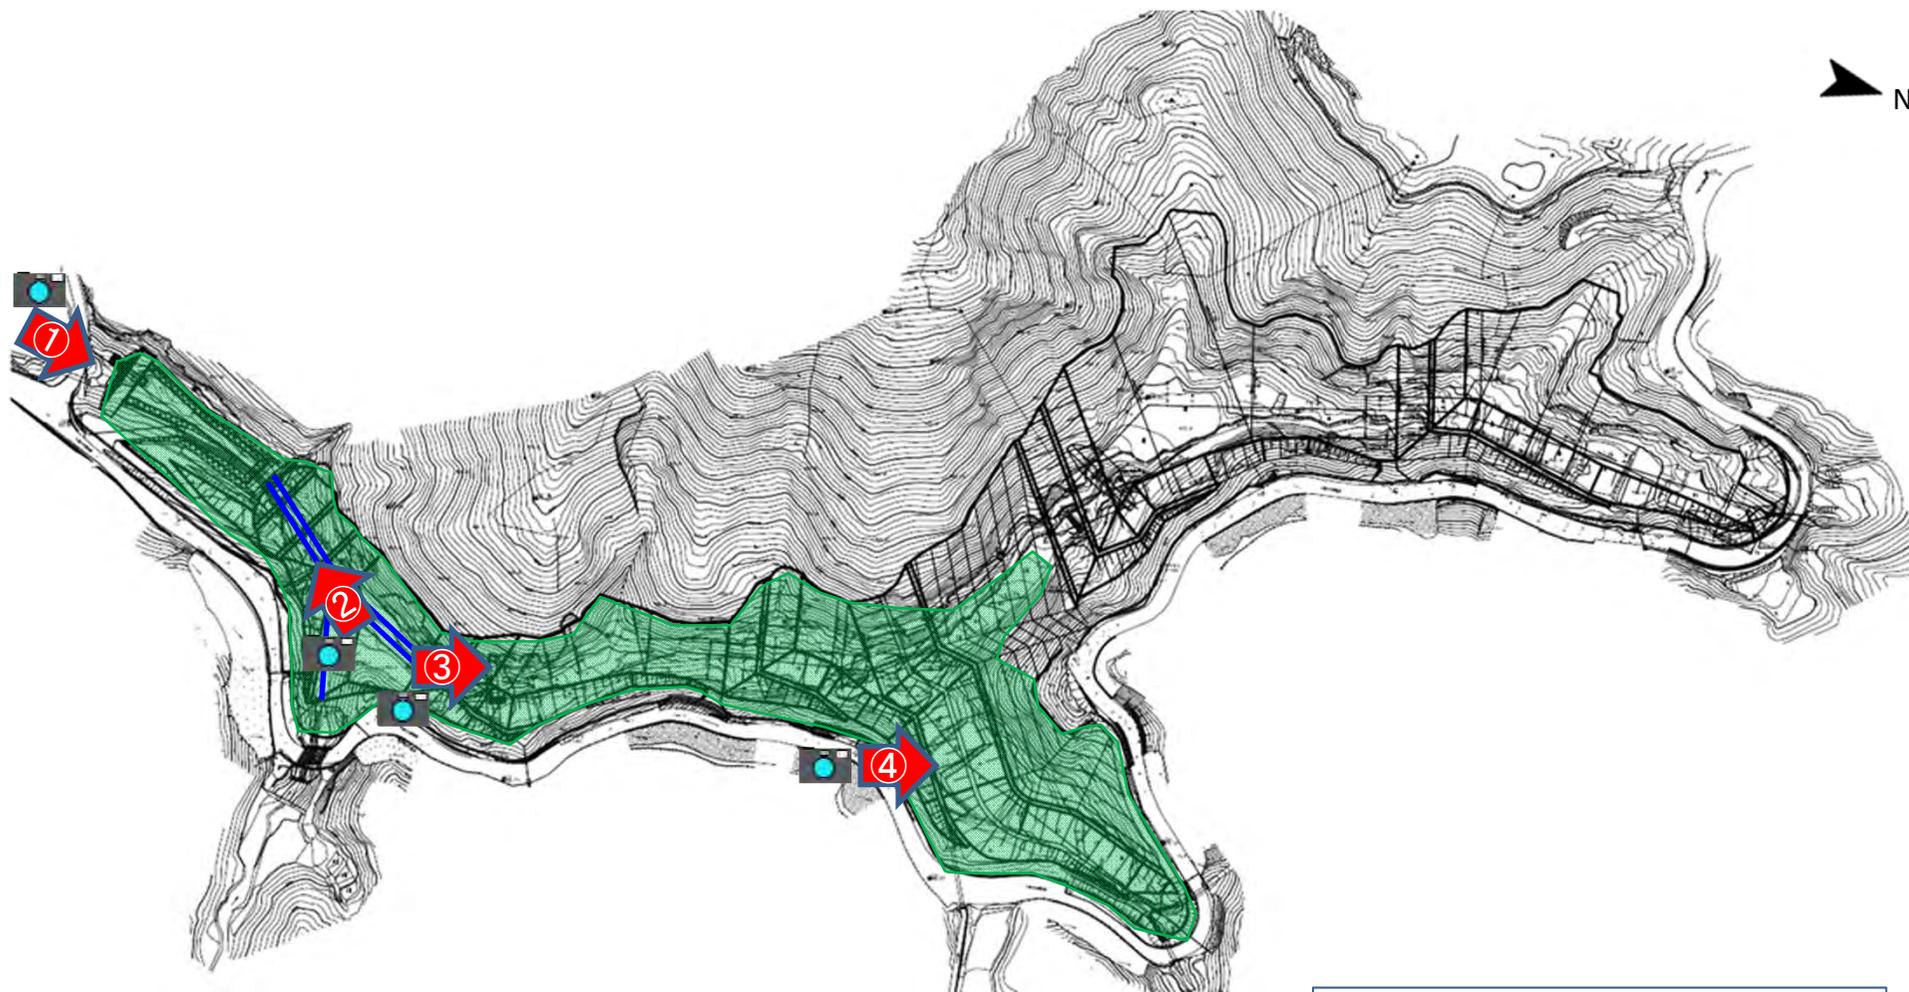

発生土置き場(戸中)



発生土置き場(戸中)



調整池施工状況



盛土の品質管理



地耐力の確認状況



御手形交差点改良



村道黒谷線改良

本日の対策委員会

主な作業箇所	4月	5月	6月
道路改良 (村道黒谷線、御手形交差点等)			
戸中非常口ヤード (坑外設備設置、掘削)			
発生土置き場(戸中) (調整池・地下排水・造成等)			

※工程は現時点の予定です。

準備が完了次第、6月下旬以降の斜坑掘削を予定しております。

(車両通行時間)

第4条 工事用車両の通行時間について、資機材の運搬は午前7時から午後7時までを基本とし、発生土の運搬は午前8時から午後6時まで、坂島非常口から発生土置き場(本山)の間は終日を基本とする。通学時間帯において、乙は、工事用車両を可能な限り通行させないよう努めるものとする。また、必要により、豊丘南小学校、豊丘北小学校、豊丘中学校及び村教育委員会と工事用車両通行時間について協議するものとする。
