



# 第24回豊丘村リニア対策委員会説明資料


## リニア関連電力供給設備

2021年10月8日

中部電力パワーグリッド(株)  
リニア関連送変電工事所

資料の複製・転写はご遠慮願います。

### 下伊那変電所 土地造成工事の状況 (1)



写真①-1 沈砂調整池堰堤 下流水路 構築完了



正面より

写真①-2 沈砂調整池堰堤 下流水路 構築完了



上部より

2 資料の複製・転写はご遠慮願います。

# 下伊那変電所 土地造成工事の状況 (2)

写真② 土留擁壁上部 盛土状況



写真④ 変電所ヤード 盛土状況



写真③ 搬入道路 盛土状況



写真⑤ 変電所ヤード 造成状況



3 資料の複製・転写はご遠慮願います。

## 変電所工事の進捗スケジュール

工事種別	年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度
		10~3	4 ~ 3	4 ~ 3	4 ~ 9 10 ~ 3	4 ~ 9 10 ~ 3	4 ~ 9 10 ~ 3	4 ~ 9 10 ~ 3
土木工事	村道・県道改修	[Bar]						
	土地造成工事		▼3/4着手	▼変電所ヤード造成開始		▼変電所ヤード造成完了		
	機器基礎工事				▼10/1着手	[Bar]		
電気工事				▼9/23着手	[Bar]			2024/10 運転開始予定▼
建築工事				▼10/4着手	[Bar]			

4 資料の複製・転写はご遠慮願います。

# 送電線工事の進捗状況



- 凡例
- : 仮設工事中
  - : 仮設工事完了
  - : 基礎工事中
  - : 基礎工事完了
  - : 組立工事中
  - : 組立工事完了
  - : 架線工事中
  - : 架線工事完了
  - : 撤去
  - : 仮工事

	完了基数				
	伐採	仮設	基礎	組立	架線
下伊那南幹線	0/2 基	0/2 基	0/2 基	0/2 基	0/4 径間
豊丘線	7/9 基	4/10 基	2/10 基	0/10 基	0/11 径間
小波川線	17/20 基	15/20 基	12/20 基	10/20 基	8/21 径間


5 資料の複製・転写はご遠慮願います。

# 送電線工事の進捗状況

写真① 小波川線No.4~No.12 架線工事 (完了)



写真② 南信幹線No.147 重量ステージ (完了)

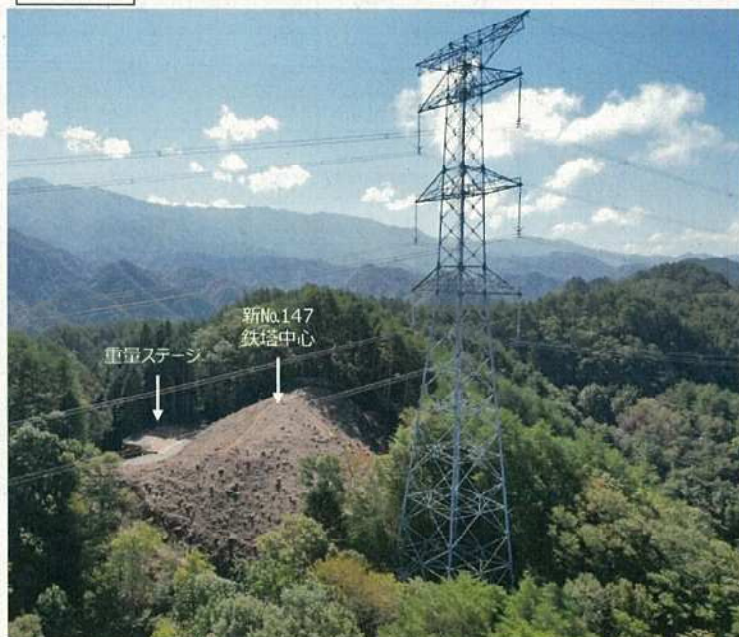

6 資料の複製・転写はご遠慮願います。

写真③ 豊丘線No.10 搬入路拡幅 (完了)



豊丘線No.10 基礎工事中



7 資料の複製・転写はご遠慮願います。


## 送電線工事のスケジュール

地区名	2019年度		2020年度		2021年度		2022年度		2023年度		2024年度		
	4~9	10~3	4~9	10~3	4~9	10~3	4~9	10~3	4~9	10~3	4~9	10~3	
林区	野田平	小渋川線 (5~20)						小渋川線 (5~20)					
	上佐原	小渋川線 (1~4)		豊丘線 (1~3)				南信幹線		下伊那分岐線			
	下佐原	豊丘線 (4~5)						豊丘線 (4~5)					
	木門			豊丘線 (6)				豊丘線 (6)					
福島区	本村							豊丘線 (7)				豊丘線 (7)	
	寺島1							豊丘線 (8)				豊丘線 (8)	
	大柏							豊丘線 (9~10)				豊丘線 (9~10)	

<凡例>

- : 小渋川線の工事
- : 豊丘線の工事
- : 南信幹線の工事
- : 架線工事
- : 休工 (止め山等)

8 資料の複製・転写はご遠慮願います。

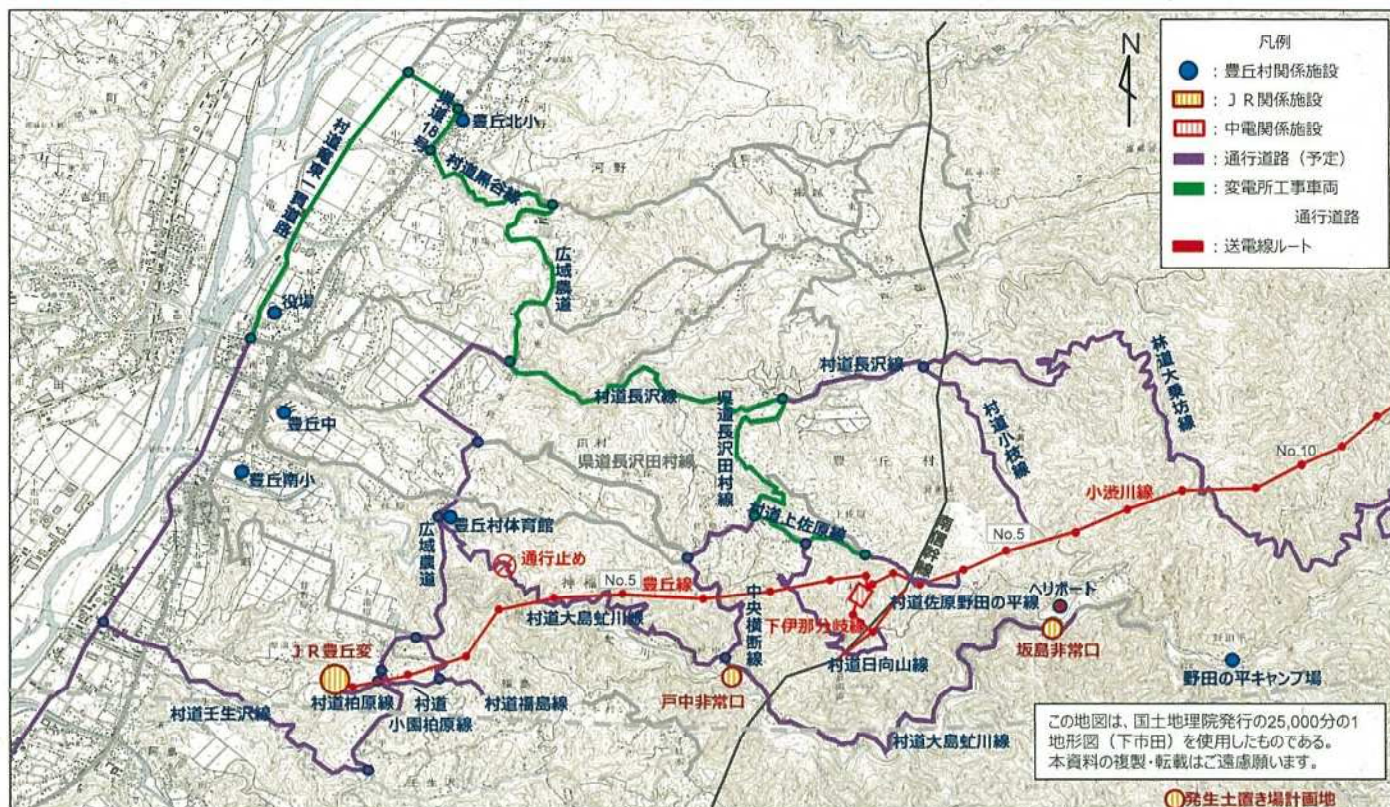

9 資料の複製・転写はご遠慮願います。

## お問い合わせ先

### ■中部電力パワーグリッド株式会社

#### リニア関連送変電工事所

〒395-0085 飯田市吾妻町100番地

TEL 0265-54-6902 fax 050-7771-9001

土日・祝日を除く、午前9時～午後4時30分まで

10 資料の複製・転写はご遠慮願います。



中部電力パワーグリッド

資料の複製・転写はご遠慮願います。
