


第29回豊丘村リニア対策委員会




東海旅客鉄道株式会社

1. 豊丘村内の工事概要
2. 坂島工区 戸中・壬生沢工区の工事進捗状況について
3. 阿島北工区における道路改良工事について

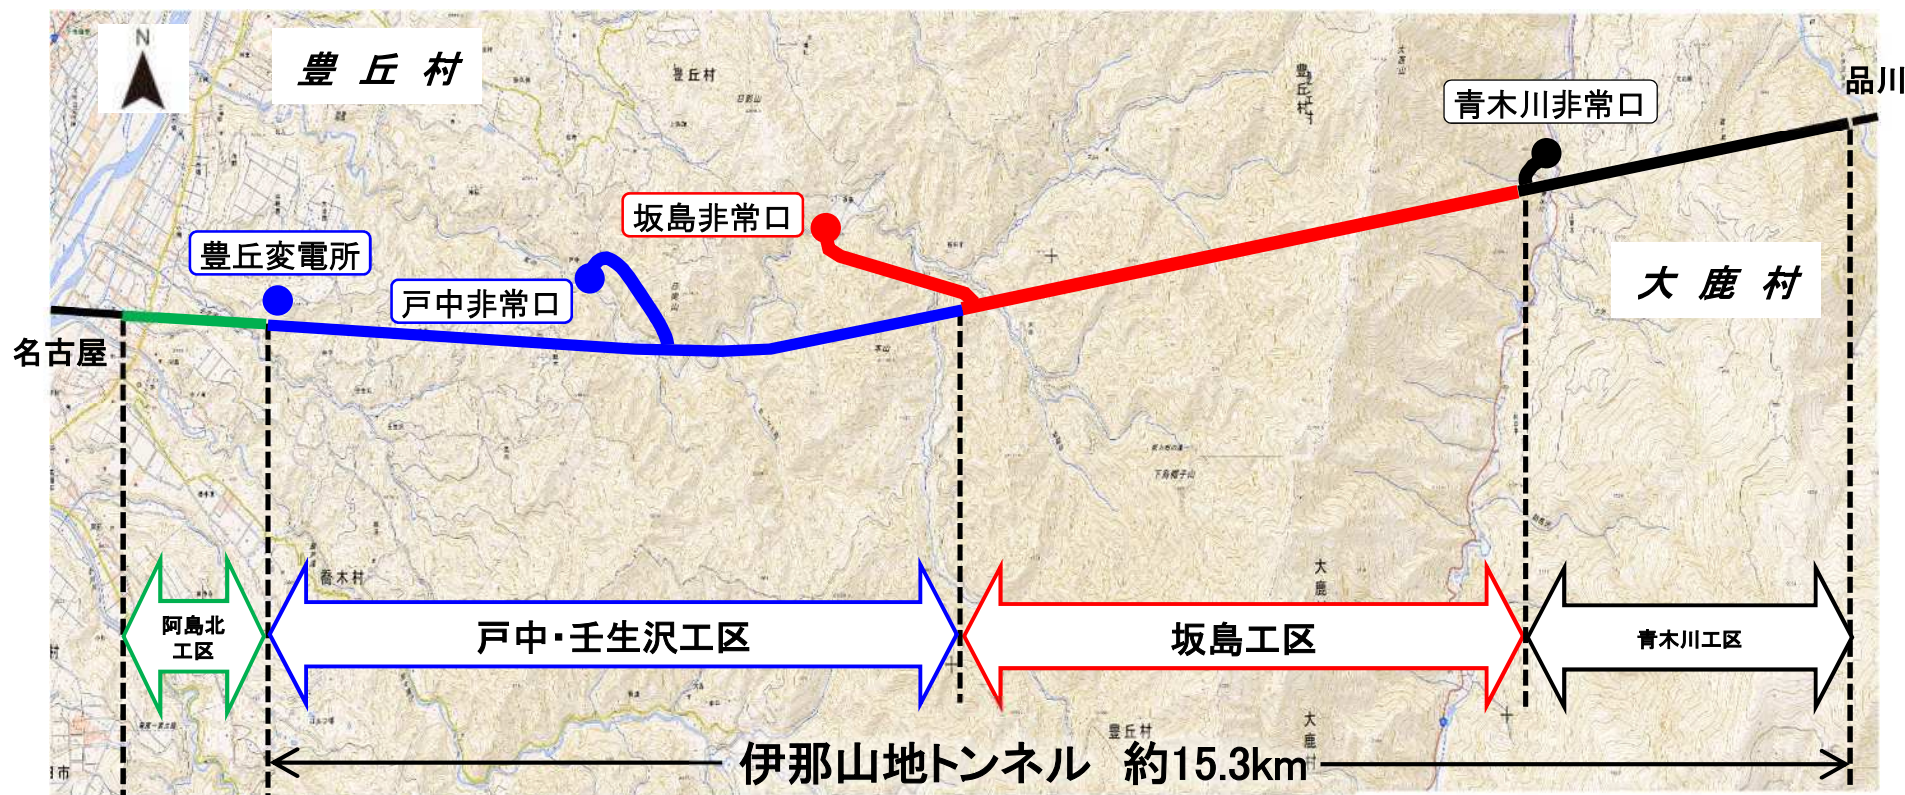

工事名称	中央新幹線阿島北高架橋ほか 新設	中央新幹線伊那山地トンネル 新設(戸中・壬生沢工区)	中央新幹線伊那山地トンネル 新設(坂島工区)
請負会社	飛島建設(株)、神稲建設	飛島建設(株)、(株)市川工務店	清水建設(株)、大日本土木(株)
施工延長	約1.1km	約6.6km	約5.1km
契約工期	2021年4月22日 ~2026年3月31日	2018年9月6日 ~2026年9月30日	2016年9月29日 ~2026年9月30日

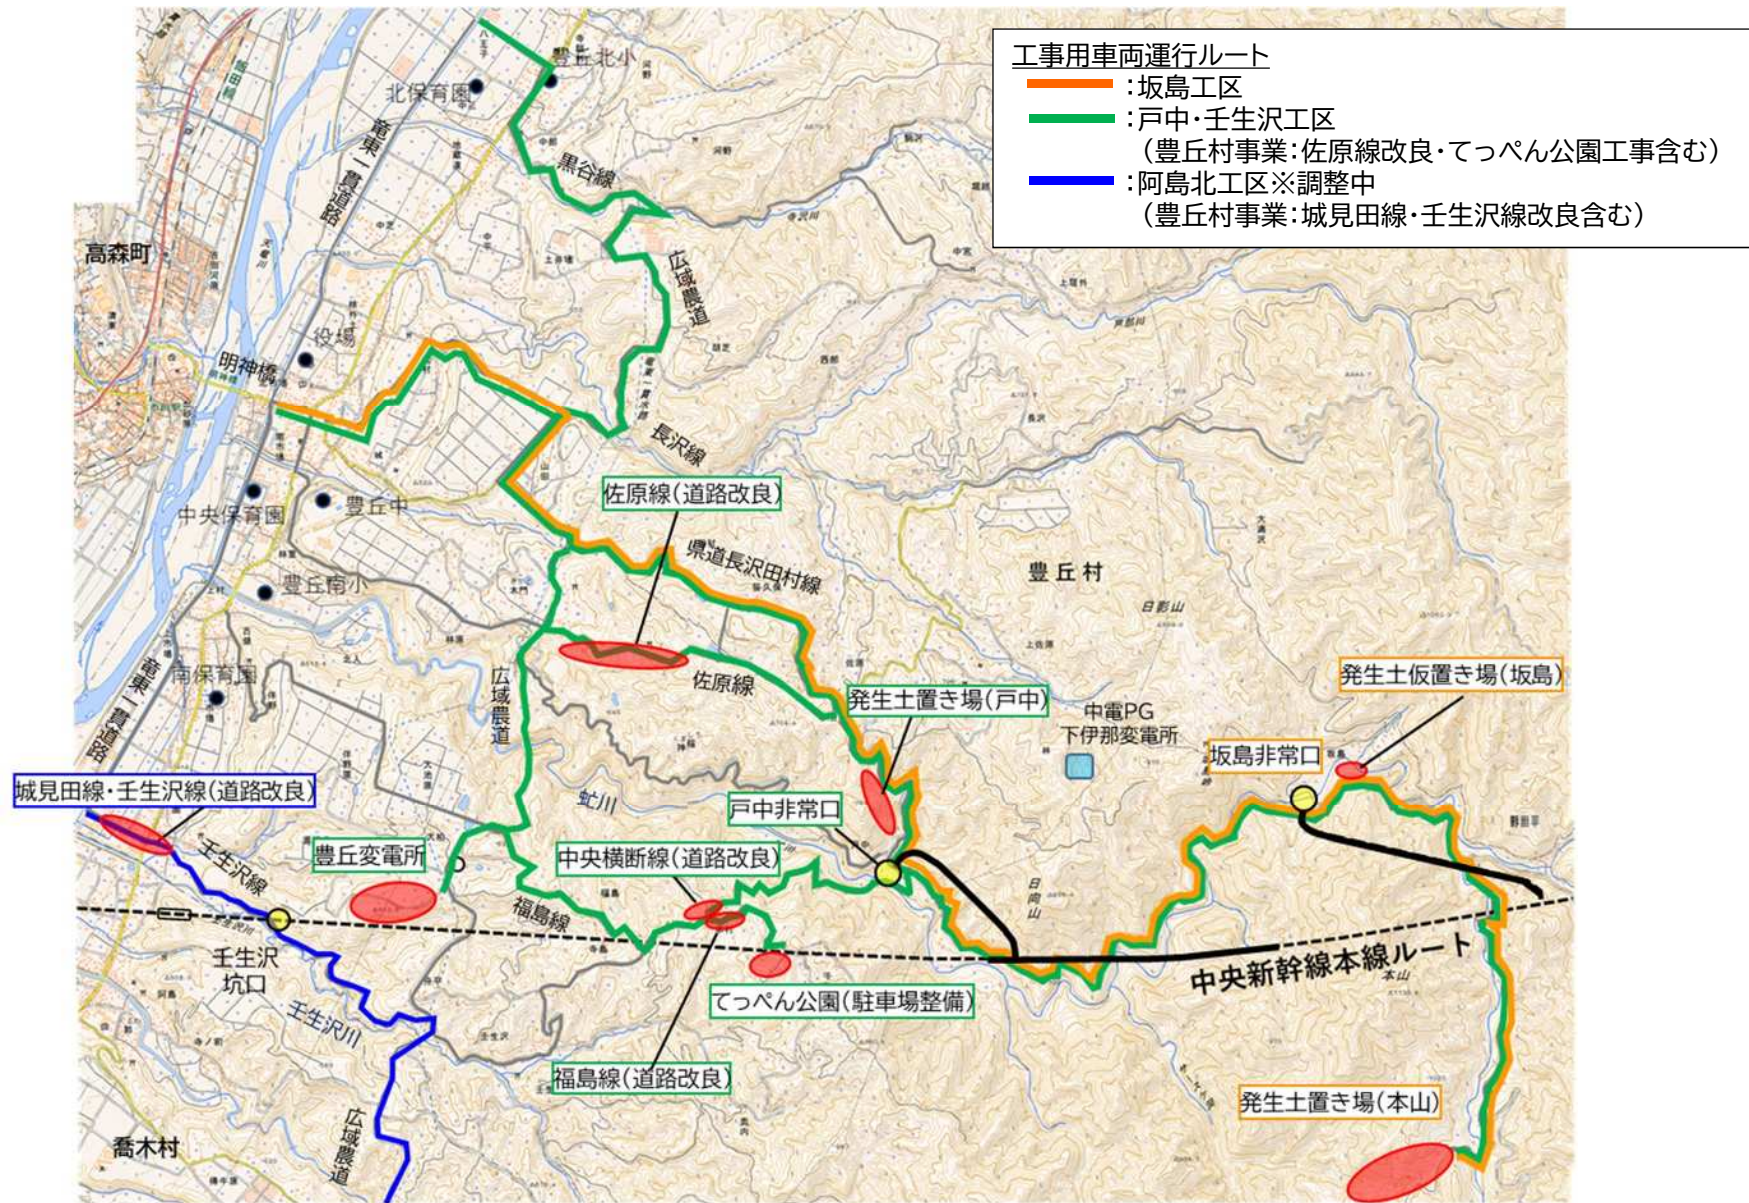


【トンネル工事】

- ・令和6年4月に斜坑の掘削が完了し、現在本坑掘削に向けた準備作業を行ってます。



【発生土置き場(本山)】

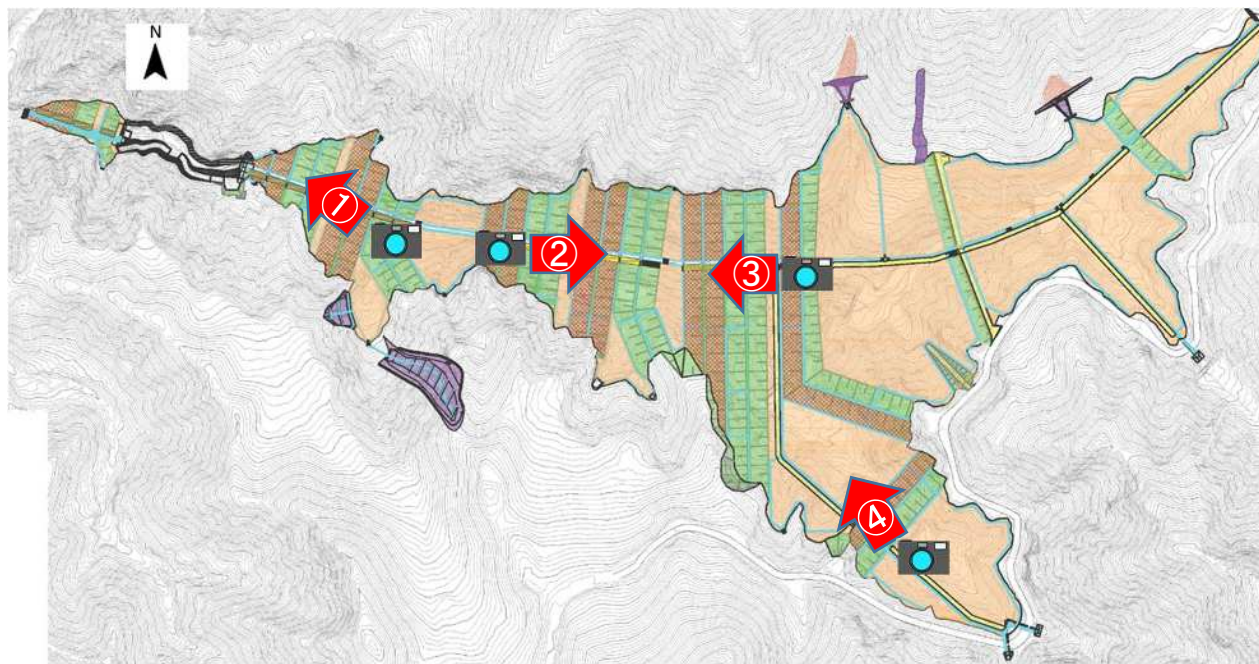

工事の予定(坂島工区)

本日の対策委員会

主な作業箇所	5月	6月	7月	8月	9月	10月
坂島非常口ヤード (トンネル掘削)						
発生土置き場(本山) (パイロット道路造成、 地下排水工、埋設工等)						
発生土仮置き場(坂島) (発生土仮置き、 発生土粒度調整)						


※工程は現時点の予定です。

【トンネル工事】

- ・斜坑の掘削が完了し、2022年11月から本坑を掘削しています。斜坑との交点から品川方面(東)に向け掘削しており、坂島工区まで(約2.7km)の内、約6割掘削しています。




【発生土置き場(戸中)】

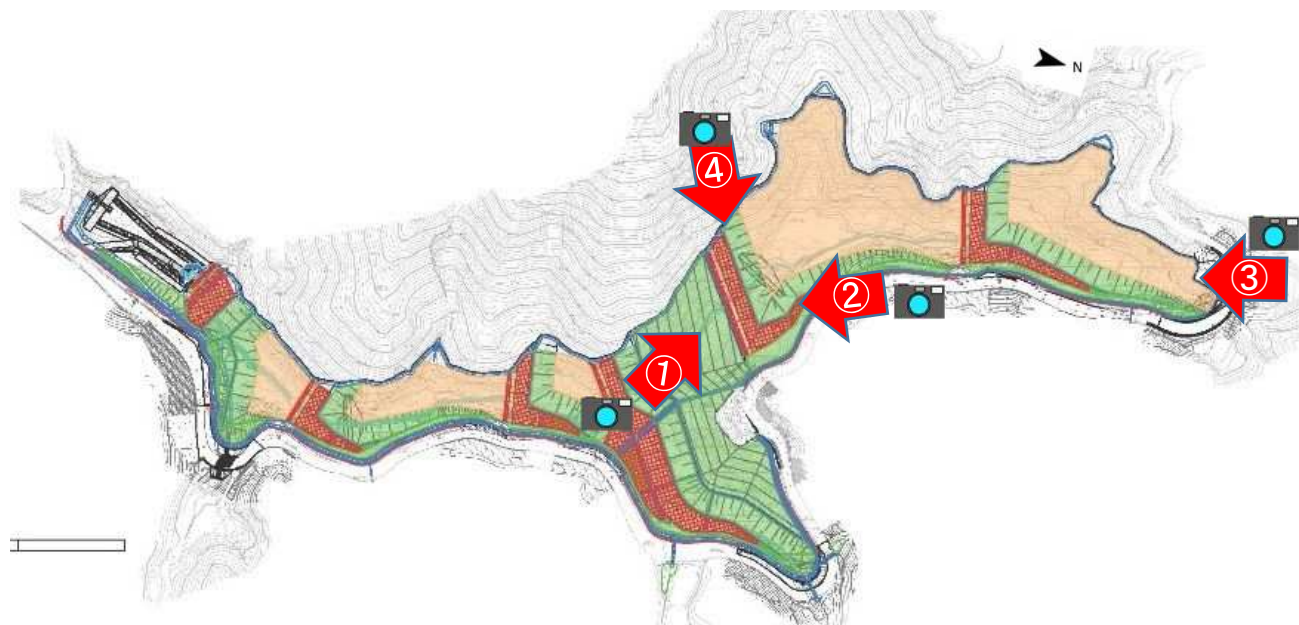


【豊丘変電所造成工事】


- ・令和5年11月から造成工事に先立ち、村道の付替工事を開始しました。
- ・現在は村道付替工事を進めるとともに、造成工事の準備工を行っています。

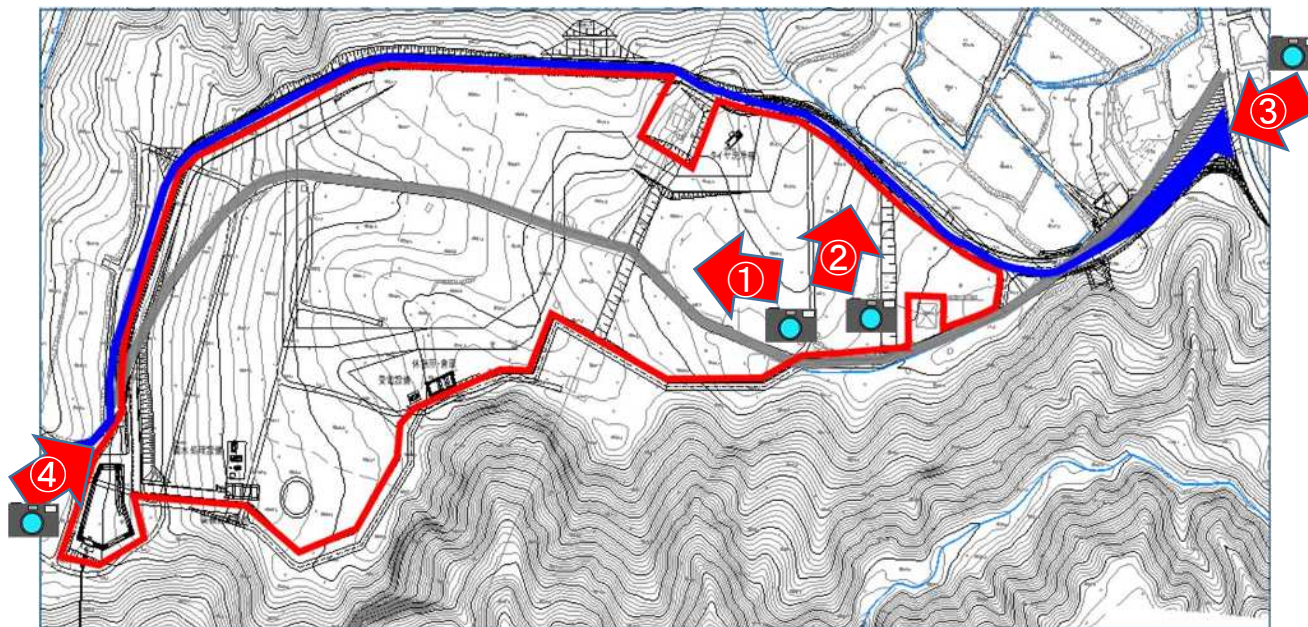


【村道佐原線道路改良事業】

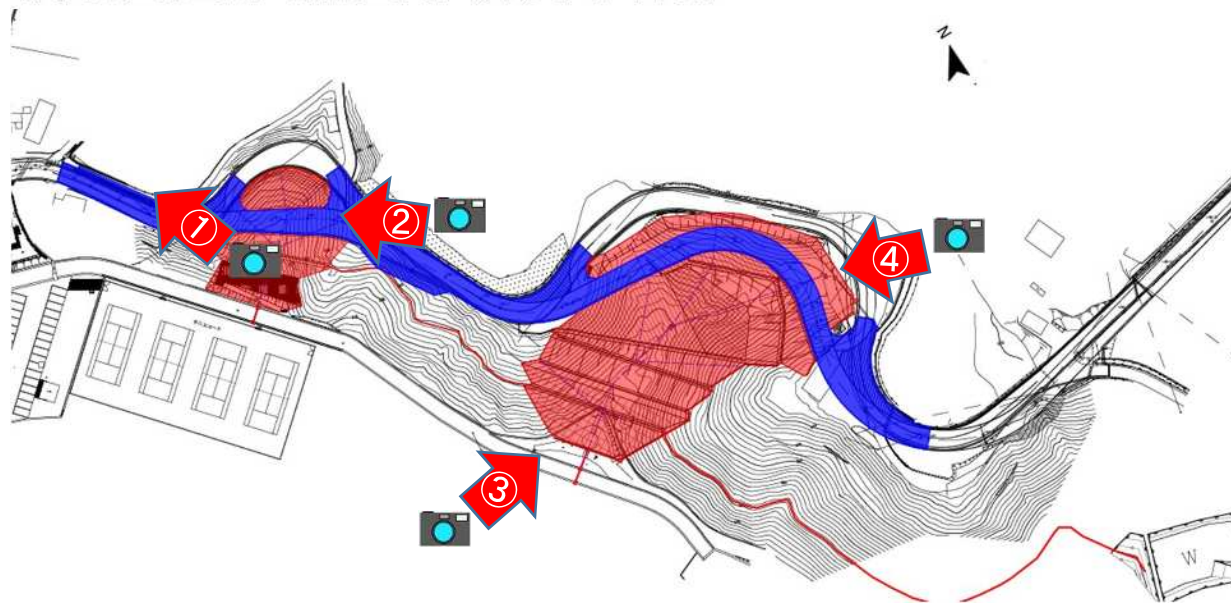

【村道佐原線道路改良事業】

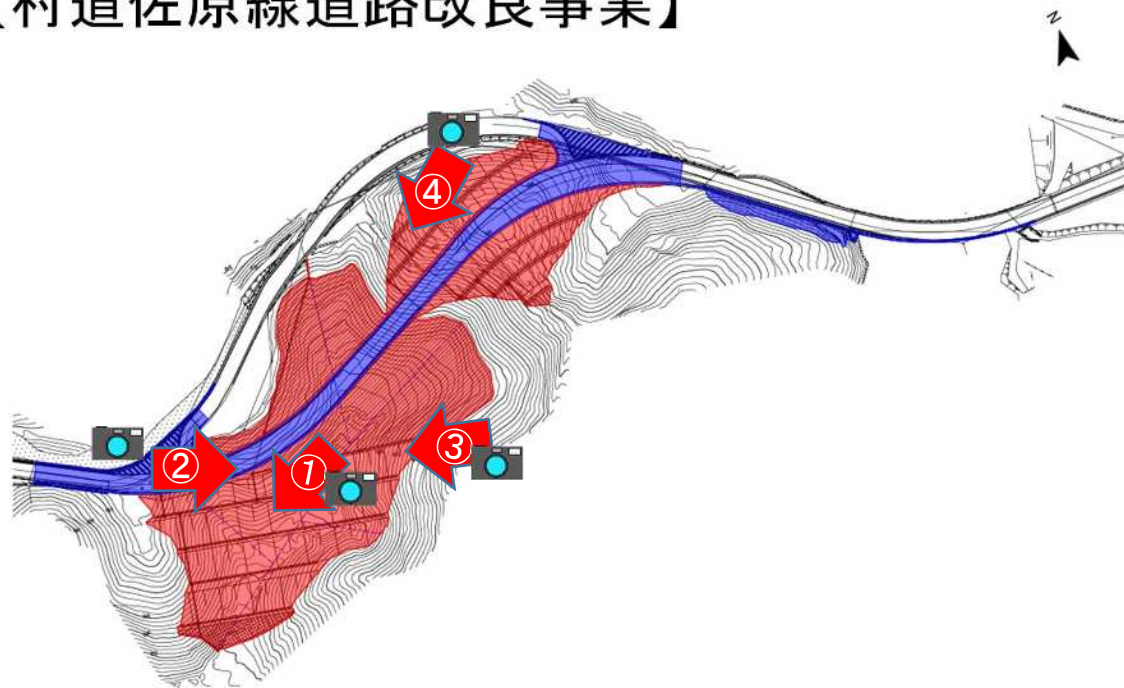

【福島てっぺん公園駐車場整備事業】

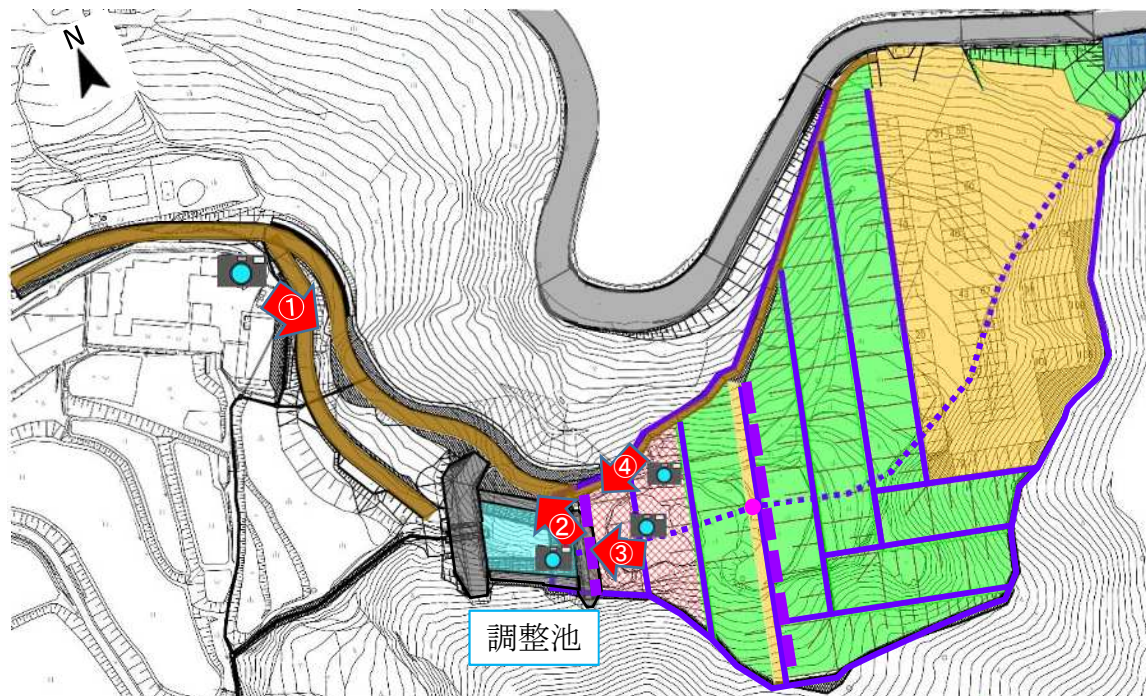

【村道福島線・中央横断線道路改良事業】

- ・令和5年11月から村道福島線、12月から村道中央横断線(通称、鍋倉線)で道路改良工事を開始しました。

【村道福島線】



【村道中央横断線】



▼ 本日の対策委員会

主な作業箇所	5月	6月	7月	8月	9月	10月
戸中非常口ヤード (トンネル掘削・インバート工)						
発生土置き場(戸中) (盛土造成・各種排水工等)						
豊丘変電所 (村道付替・調整池設置等)						
村道佐原線道路改良工事【村事業】 (補強土壁工等)						
福島てっぺん公園駐車場整備工事【村事業】 (調整池設置工等)						
村道福島線・中央横断線道路改良【村事業】 (側溝入替等)						

※工程は現時点の予定です。

【村道城見田線・村道壬生沢線道路改良事業】

・令和6年4月から村道壬生沢線の道路改良工事を開始しました。

村道城見田線・村道壬生沢線(道路改良 区間①) 工事概要図



道路拡幅工

城見田線

豊丘村
300

※村道改良等、村事業の工事用車両はこちらのステッカーを貼付けて運行しています。
(番号は、300番台を使用します。)



道路拡幅に伴う家屋撤去

▼ 本日の対策委員会

主な作業箇所	5月	6月	7月	8月	9月	10月
村道城見田線・村道壬生沢線道路改良事業						
区間①(村道城見田線～園橋)						

※工程は現時点の予定です。
